



बरेड गाउँपालिका  
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय  
हुग्दिशिर, बागलुङ

आर्थिक वर्ष २०८२-०८३

वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम  
तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

२०८३ साउन २७ गते

# बरेङ गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय प्रगती प्रतिवेदन २०८२/०८३

मिति- २०८३/०४/२७गते

बरेङ गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,  
हुग्लेशिर बागलुङप्रस्तोता: कमला न्यौपाने  
लेखा अधिकृत

## १. आ.व. २०८२/०८३ को बजेट निकासी तथा खर्च प्रगति विवरण :-

| क्र.सं. | शीर्षक                           | आ.व. ०८२/०८३ को<br>स्विकृत वार्षिक बजेट | आ व २०८२।८३ को हाल सम्मको |                 |              | यथार्थ आयमा<br>खर्च प्रतिशत |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
|         |                                  |                                         | प्राप्त आय                | यथार्थ खर्च     | खर्च प्रतिशत |                             |
| १       | कुल जम्मा बजेट                   | ४१,०४,४२,१३७.८७                         | ३७,५०,८४,३०४.०९           | ३३,८७,४४,१३२.२६ | ८२.५३        |                             |
| २       | कुल पूँजिगत बजेट                 | ११,५५,२२,३०९.८७                         |                           | ८,८५,२१,७९४.८७  | ७६.६३        |                             |
| ३       | कुल चालु बजेट                    | २९,४९,१९,८२८.००                         |                           | २५,०२,२२,३३७.३९ | ८४.८४        |                             |
| ४       | संघीय वित्तीय समानिकरण<br>अनुदान | ७,४१,००,०००.००                          | ६,७७,६४,४५०.००            | ५,८७,२१,६२१.८४  |              |                             |
| ५       | संघीय सशर्त अनुदान<br>पूँजिगत    | २५,००,०००.००                            | १८,२०,८४२.७७              | १८,२०,८४२.७७    | ७२.८३        |                             |
| ६       | संघीय सशर्त अनुदान चालु          | १८,७२,०९,०००.००                         | १६,९४,५०,५५०.९४           | ११,७३,०९,२९२.४  | ९०.५९        |                             |



|    |                                | स्विकृत बजेट   |                |                |              |
|----|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|    |                                |                | यथार्थ आय      | यथार्थ खर्च    | खर्च प्रतिशत |
| ७  | संघीय विशेष अनुदान चालु        | १,३०,००,०००.०० | ८८,३१,७४३.६५   | ८८,३१,७४३.६५   | ६७.९४        |
| ८  | संघीय समपुरक अनुदान पूँजिगत    | ९१,००,०००.००   | ७५,६५,३१२.००   | ७५,६५,३१२.००   | ८३.१४        |
| ९  | प्रदेश वित्तीय समानिकरण अनुदान | ८८,८५,०००.००   | ८८,८५,०००.००   | ५३,७६,६९६.३६   |              |
| १० | प्रदेश सशर्त अनुदान पूँजिगत    | २,००,०००.००    | १,००,०००.००    | ८४,०००.००      | ४२           |
| ११ | प्रदेश समपुरक अनुदान पूँजिगत   | १,६२,५३,५७०.०० | १,५२,३६,७५९.०० | १,५२,३६,७५९.०० | ९३.७४        |
| १२ | प्रदेश विशेष अनुदान पूँजिगत    | ४०,००,०००.००   | २०,००,०००.००   | १८,७५,१२९.६१   | ४६.८८        |
| १३ | संघीय राजस्व बाँडफाँड          | ६,५४,९२,६२०.०० | ६,४५,५५,२०९.१८ | ४,९१,८३,०९८.४४ |              |
| १४ | प्रदेश राजस्व बाँडफाँड         | ६८,७४,०००.००   | ६०,०६,९२९.४४   | ३५,६५,३०२.०७   |              |
| १५ | आन्तरिक आय                     | ३५,००,०००      | ४१,०२,१४७.६३   |                |              |
| १६ | गत वर्षको अल्या                | १,९३,२७,९४७.८७ | १,९३,२७,९४७.८७ | १,७०,३३,०७५.५८ |              |

२. आ.व. २०८२/०८३ को क्षेत्रगत प्रगति विवरण (सशर्त र निशर्त समेत)

| सि.नं. | विषयगत क्षेत्र                    | विनियोजित बजेट  | खर्च रकम        | वित्तीय प्रगति प्रतिशत |
|--------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| १      | पूर्वाधार विकास                   | ८,८८,४२,३०९.८७  | ७,००,२५,६७२.४४  | ८६.८५                  |
| २      | आर्थिक विकास                      | ३,११,०९,०००.००  | २,४२,०२,८२६.१७  | ७७.८                   |
| ३      | सामाजिक विकास                     | २२,३४,६१,५२५.०० | १९,४०,७९,१७९.८६ | ८६.८५                  |
| ४      | सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र | १,२८,२५,०००.००  | ९५,६९,६३५.१०    | ७४.६२                  |
| ५      | कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक    | ५,४२,०४,३०३.००  | ४,०८,६६,८१८.६९  | ७५.३९                  |
|        | कुल जम्मा                         | ४१,०४,४२,१३७.८७ | ३३,८७,४४,१३२.२६ | ८२.५३                  |

## वडागत बजेट विनियोजन

| वडा नं | बार्षिक बजेट विनियोजन | हाल सम्मको खर्च | खर्च प्रतिशत |
|--------|-----------------------|-----------------|--------------|
| १      | ८१,७५,०००.००          | ६५,५६,५०२.४६    | ८०.२         |
| २      | १,२२,००,०००.००        | ९६,९६,७२५.७७    | ७९.४८        |
| ३      | ८८,००,०००.००          | ५६,१७,२८१.०९    | ६३.८३        |
| ४      | ६४,७५,०००.००          | ५८,८५,३५९.८९    | ९०.८९        |
| ५      | ६४,००,०००.००          | ५८,८१,६०८.८९    | ९१.९         |

## समस्याहरु

- ❖ सेस्ताहरुको व्यवस्थापनमा कठिनाई,
- ❖ सुत्र (SUTRA) प्रणालीमा प्राविधिक अवरोध, इन्टरनेट र सर्भरको ढिलाइ।
- ❖ Documentation कमजोरी,
- ❖ असार मसान्तमा मात्र भुक्तानीका फाइलहरु थुप्रिने र बजेट खर्चको चाप बढ्ने प्रवृत्ति,
- ❖ नियमानुसार रीत नपुगेका, नापजाँच र अनुगमन प्रतिवेदन स्पष्ट नभएका फाइलहरु भुक्तानीका लागि पेश हुनु,
- ❖ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा र कागजात अपुग हुँदा अन्तिम लेखापरीक्षणमा बेरुजु बढ्दै जानु।



## बरेङ गाउँपालिकाको आ.व २०८२।०८३ को वार्षिक शाखागत प्रतिवेदन समीक्षा



मिति- २०८३/०४/२७ गते  
बुधबार

बरेङ गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,  
हुग्लिदिशिर बागलुङ

प्रस्तोता: इ. राम कृष्ण पौडेल  
पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा

## बरेङ गाउँपालिकाको आ.व २०८२।०८३ को वार्षिक शाखागत प्रतिवेदन

| क्र.स. | विवरण                                               | संख्या | कैफियत |
|--------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| १.     | जम्मा आयोजना संख्या                                 | १२५    |        |
| २.     | सम्पन्न भएको आयोजना संख्या                          | १२१    |        |
| ३.     | सम्पन्न नभएको आयोजना संख्या                         | ४      |        |
| ४.     | निर्माण सम्पन्न आयोजना संख्या                       | ११२    |        |
| ५.     | सम्पन्न भइ निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना संख्या | ७      |        |
| ६.     | निर्माणधिन (क्रमागत) आयोजना संख्या                  | २      |        |

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०८२/८३

बरेङ गाउँपालिका

हुन्दीशीर-२, बागलुङ

पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा

| क.स. | शिराँक           | इकाइ   | मात्रा<br>(Quantity) | भुक्तानी रकम रु. | मुल्याङ्कन रकम (डेक्का र<br>उपमोक्ता समितिको<br>साँझरी सहित) रु. |
|------|------------------|--------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| १.   | <b>सडक</b>       |        |                      |                  |                                                                  |
|      | नयाँ टाक         | कि.मि. | ५.८३                 | 2515928.29       | 2722421.34                                                       |
|      | सडक मर्मत        | कि.मि. | ४५.३२                | 3403994.78       | 3425624.22                                                       |
|      | ढलान सडक         | मिटर   | १६२०.८०              | 20608156.12      | 20806408.63                                                      |
|      | मेशिनरि बाल      | घ.मि.  | १२३.१०               | 1329037.47       | 1384417.89                                                       |
|      | ग्राभेल          | घ.मि.  | ८८.५०                | 112983.60        | 126385.00                                                        |
|      | प्लम कंक्रीट बाल | घ.मि.  | १४३.६२               | 1358328.31       | 1358328.31                                                       |
|      | ग्याबिन          | घ.मि.  | १५१.००               | 698495.12        | 740564.95                                                        |
|      | पाँक्क नालि      | मि.    | ११७७.४५              | 2801777.72       | 2927933.08                                                       |
|      | सोलिड            | घ.मि.  | १०६८.९६              | 2526126.31       | 2545328.54                                                       |
|      | हुम पाइप कलमर्ट  | मि.    | १०                   | 140843.66        | 156649.60                                                        |

| २. | शौचालय              |       |   |           |           |
|----|---------------------|-------|---|-----------|-----------|
|    | नयाँ                | नम्बर | १ | 200000.00 | 276072.93 |
|    | मर्मत               | नम्बर | १ | 139699.96 | 186308.85 |
| ३. | <b>मन्दिर</b>       |       |   |           |           |
|    | नयाँ                | नम्बर | १ | 237500.00 | 266086.33 |
|    | मर्मत               | नम्बर | २ | 376072.17 | 420691.68 |
| ४  | <b>उर्जा</b>        |       |   |           |           |
|    | लघु जलविद्युत मर्मत | नम्बर | १ | 163113.67 | 186572.07 |
|    | सोलार बत्ती         | नम्बर | ८ | 494940    | 494940    |
|    | विद्युतिय पोल       | नम्बर | १ | 26000     | 28600     |

| ५ | सिंचाइ                                                 |       |        |             |             |
|---|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|-------------|
|   | पक्क कुलो                                              | मिटर  | ५२४.६३ | 1082994.68  | 1271078.82  |
|   | पाइप                                                   | मिटर  | ३०.००  | 53450.09    | 59800.95    |
| ६ | <b>भवन</b>                                             |       |        |             |             |
|   | बरेड गाँउपालिकाको<br>प्रशासकीय भवन निर्माण (<br>कमागत) | नम्बर | १      | 21144918.00 | 21144918.00 |
|   | पक्क                                                   | नम्बर | २      | 854352.30   | 954883.87   |
|   | मर्मत (स्वास्थ्य संस्था समेत)                          | नम्बर | २१     | 6252453.21  | 6607434.17  |
| ७ | <b>फर्निचर</b>                                         |       |        |             |             |
|   | डेस्क÷बेन्च निर्माण                                    | सेट   | ३२     | 200000.00   | 200000.00   |
| ८ | <b>पैदल मार्ग</b>                                      |       |        |             |             |
|   | नयाँ ट्राक                                             | मिटर  | ९५.५०  | 93036.55    | 103935.73   |
|   | मर्मत                                                  | मिटर  | ६२०.०० | 142059.96   | 158346.28   |

| ९  | खेलमैदान                       |       |         |            |            |
|----|--------------------------------|-------|---------|------------|------------|
|    | नयाँ                           | नम्बर | १       | 593288.58  | 669097.30  |
|    | मर्मत                          | नम्बर | २       | 756891.72  | 851674.16  |
| १० | <b>पुल-कल्भर्ट</b>             |       |         |            |            |
|    | नयाँ                           | नम्बर | १       | 142500.00  | 166517.00  |
|    | <b>Steel foot trail bridge</b> | नम्बर | १       | 475000     | 538891.34  |
| ११ | <b>खानेपानी</b>                |       |         |            |            |
|    | इन्टेक                         | नम्बर | ५       | 263751.78  | 287874.84  |
|    | आर.भि.टि.                      | नम्बर | ४       | 793247.69  | 856940.31  |
|    | पाइप लाइन                      | मिटर  | ५३५९.५० | 1873449.04 | 1908986.31 |
|    | मर्मत                          | नम्बर | १       | 92248.94   | 103418.09  |



| क्र.सं. | विविध                                                          | नम्बर                       |                      |                        |             |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
|         | कृषि हाटबजार स्तरउन्नती                                        | नम्बर                       | १                    | 1880534.67             | 1880534.67  |
|         | सागदी सत्यवती पुर्वाधार निर्माण                                | नम्बर                       | १                    | 284413.12              | 316106.33   |
|         | तरकारी वालीको नयाँ पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन (टनेल निर्माण) | नम्बर                       | ५७                   | 720000                 | 864764.95   |
|         | टिप्लीडघाट ीपु मर्मत                                           | नम्बर                       | १                    | 92237.99               | 102507.20   |
|         | विपद व्यवस्थापन (बल बहादुर साकी)                               | नम्बर                       | १                    | 400000.00              | 448833.74   |
|         | बडगुरको नयाँ पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन                      | नम्बर                       | २३                   | 1496052.46             | 1761593.33  |
| १३.     | रोजगार तर्फ                                                    | नम्बर                       |                      | 12458037.00            | 12458037.00 |
|         |                                                                |                             | जम्मा रकम            | 88858841.62            | 91359802.12 |
| क.स.    | आ.व.२०८२-०८३ मा पुर्वाधार निर्माण तर्फ जम्मा विनियोजित रकम रु. | जम्मा भुक्तानी भएको रकम रु. | भौतिक प्रगती प्रतिशत | वित्तिय प्रगती प्रतिशत |             |
| १.      | 108039774.52                                                   | 88858841.62                 | 82.24                | 82.24                  |             |

## २. कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना तथा कार्यक्रमहरु

| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                    | कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण                                 | कैफियत    |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| १       | बडा कार्यालय शौचालय निर्माण                     | निर्माण प्रक्यामा नगएको                                       | बडा नं. १ |
| २       | लुडुदी खोला सिंचाइ योजना                        | उ.स.ले कार्य सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको,                      | बडा नं. १ |
| ३       | लुडुदी खोला तल्लो गडेल टिमुरे सिंचाइ कुलो मर्मत | उ.स.ले कार्य सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको,                      | बडा नं. १ |
| ४       | धुल्लुलिउवा मा.वि. खेलमैदान निर्माण तथा तारजाली | विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कार्य सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको, | बडा नं. १ |
| ५       | सक्नेरी पहिरो नियन्त्रण                         | योजना समीता हुन नसकेको                                        | बडा नं. २ |
| ६       | सामुदायिक भवन मर्मत                             | उ.स.ले कार्य सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको,                      | बडा नं. २ |
| ७       | सामुदायिक भवन निर्माण                           | उ.स.ले कार्य सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको,                      | बडा नं. २ |

## शाखा वा वडा सँग सम्बन्धित प्राप्त गुनासोहरु

- निर्वाचन,निर्माण सामाग्रीको मुल्यवृद्धि र मौसम प्रतिकुल हुदा काम ढिला सम्पन्न हुन गई लेखा शाखामा फाइल ढिला पेश र भुक्तानी गर्ने **system SUTRA** मा समस्या देखिदा केहि फाइल समयमा भुक्तानी हुन नसक्दा गुनासो आएको,
- सवारी साधनको समयमा उपलब्धता हुन नसकेको

## समस्याहरु:

- बाटो सरसफाइको कार्यविधि नबन्नु
- योजना कार्यान्वयन आ.व.को अन्त्यतिर असार महिनामा पुग्दा गुणस्तर कायम राख्न र कार्यसम्पन्न गर्न जटिल,
- वार्षिक खरिद योजना नबन्नु



## कार्यपालिका र गाउँसभासँगको अपेक्षा


- योजना कार्यान्वयन तालिका कार्यपालिकाले सशक्त प्रकारले कार्यान्वयनमा लैजान जागरुक भएमा राम्रो,
- कार्यपालिका मातहतका विषयगत समितिहरुको नियमित बैठक बसाल्न सहजीकरण गर्नुपर्ने
- हुग्दीशीर आधारभुत अस्पताल १० शैया निर्माणार्थ बजेट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पहल कदमी लिनुपर्ने ।

## Some photos

Bhandarkhola hume pipe culvert



Sigdi masonry wall and gravelling







Krishi hatbazzar protection wall

Plum wall

## Some photos

Bareng sadak starunnati



Ligdi Dhanmudha khanepani





## Photos

---

Kalakhola sinchai yojana



Baskot motor bato



## Photos

---

Bareng chipledhunga sadak



Bangur khor





## Photos

Sagdi satyawoti purbadhar  
nirman



Nyabazzar hugdisir sadak



## photos

Hirame sinchai aayojana



Canal Hiramé sinchai yojana





## photos

Compounding by  
fencing



Bhirkuti Ma Bi  
Purbadhar marmat



## photos

Ghatta mandredhunga road    Administrative Building





## Photos

Temple ward No 3



Dadakateri samudayikbhawan



## photos

Compounding work




Steel foot trail culvert



के तपाईं पनि पृष्ठपोषण लिन वा दिन चाहनुहुन्छ कि..?







## सेवा प्रवाह वा विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी गरिएका मुख्यकार्यहरू:

### प्रशासन तर्फ:

१. कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थापन गरिएको छ ।
२. कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरू फाइलिङ सहित व्यवस्थापन गरिएको छ ।
३. कर्मचारीहरूको विदाको अभिलेख व्यवस्थापन गरिएको छ ।
४. कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधीहरूको दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्थित अभिलेख राखिएको छ ।
५. पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको लागि अन्तर स्थानीय तह अनुभव आदानप्रदान तथा अवलोकन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
६. कर्मचारीको वृत्ति विकासको लागि अध्यायन विदा उपलब्ध गराइएको छ ।
७. स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ ।

## सेवा प्रवाह वा विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी गरिएका मुख्यकार्यहरू:

### प्रशासन तर्फ:

८. जनशक्ति तथा हाजिरी व्यवस्थापन: कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापन, विदाको अभिलेख र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सम्बन्धी प्रशासनिक कार्यहरू चुस्त रूपमा सम्पन्न गरिएको छ ।
९. पत्रव्यवहार (दर्ता/चलानी): आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यालयमा प्राप्त भएका कुल ११३० वटा पत्रहरू दर्ता र कार्यालयबाट बाहिर पठाइएका कुल ११०९ वटा पत्रहरूको चलानी कार्य भौतिक प्रणालीमा अभिलेखिकरण गरिएको छ ।
१०. सम्पत्ति विवरण र सुशासन: आर्थिक वर्ष समाप्त भएसँगै कर्मचारीहरूले बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण फाराम सम्बन्धी पूर्व-तयारी र सूचना प्रवाह गरिएको छ । साथै सूचनाको हक सम्बन्धी स्वतः प्रकाशनको विवरण तयार गरिएको छ ।
११. बैठक तथा समन्वय: मासिक रूपमा नियमित कर्मचारी तथा शाखा प्रमुखहरूको बैठक गरिएको छ । असार मसान्तमा बजेट फ्रिज हुन नदिने, भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने र जिन्सी भौतिक परीक्षण समितिलाई सहयोग गर्ने कार्यमा आर्थिक प्रशासन शाखा र अन्य शाखाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिएको छ ।



## सेवा प्रवाह वा विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी गरीएका मुख्यकार्यहरू:

### जिन्सी तर्फ:

१. सार्वजनिक सम्पत्ती व्यवस्थापन प्रणाली (PAMS-V2) लागू गरिएको छ ।
२. खरिद इकाई समिति गठन भई खरिदसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू व्यवस्थित गरिएको छ ।
३. गाउँपालिका र अन्तर्गतका निकायहरूमा रहेका खप्ने मालसमानको विवरण संड्कलन गरी अभिलेख व्यवस्थित गरिएको छ ।
४. जिन्सी सहायक खातालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ ।
६. सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धनलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ ।

## सेवा प्रवाह वा विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी गरीएका मुख्यकार्यहरू:

### जिन्सी तर्फ:

७. जिन्सी दाखिला : आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा खरिद भई आएका वा अन्य कार्यालयबाट हस्तान्तरण भई आएका सम्पूर्ण कार्यालय सामान, स्टेशनरी तथा पुँजीगत सामानहरूको दाखिला प्रतिवेदन तयार गरी जिन्सी खातामा आम्दानी बाँधिएको छ ।
८. मालसामान निष्कासन: कार्यालयका विभिन्न शाखाहरूबाट माग भई आएका सामानहरू स्वीकृत माग फारामको आधारमा पारदर्शी रूपमा वितरण गरिएको छ ।
९. जिन्सी खाता अद्यावधिक: खर्च भएर जाने र खर्च भएर नजाने जिन्सी मौज्दात किताबलाई असार मसान्तसम्म पूर्ण रूपमा अद्यावधिक गरिएको छ ।
१०. वार्षिक भौतिक परीक्षण: आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने जिन्सी सामानहरूको भौतिक गणनाका लागि समिति गठन भई जिन्सी मौज्दातको वार्षिक भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
११. लिलाम तथा मिनाहा तयारी: कार्यालयमा रहेका पत्रु, मर्मत हुन नसक्ने र प्रयोगविहीन पुराना सामानहरूको पहिचान गरी लिलाम वा मिनाहा प्रक्रियाका लागि सूची तयार गरिएको छ ।



आ.व. २०८२/०८३  
वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम

मिति २०८३/०४/२७ गते बुधवार  
(११४६)

बरेङ गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा  
हुम्लेशिर बागलुङ ।



बरेङ गाउँपालिकामा रहेका शैक्षिक  
संस्थाहरू

| बालविकास केन्द्र<br>सङ्ख्या | आधारभूत<br>विद्यालय<br>सङ्ख्या | माध्यमिक<br>विद्यालय          | क्याम्पस                     | सामुदायिक सिकाइ<br>केन्द्र |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| २७(गा.पा.<br>अनुदान १ सहित) | १९                             | ८ (संस्थागत<br>मा.वि. १ सहित) | १ (स्नातक<br>तह<br>सञ्चालित) | २                          |

साक्षरता सम्बन्धी विवरण  
(जनगणना २०७८ बमोजिम)




| गाउँपालिका      | महिला | पुरुष | जम्मा |
|-----------------|-------|-------|-------|
| बरेङ गाउँपालिका | ७०.१  | ८५.२  | ७६.९  |

२०८३ सालमा विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थी सङ्ख्या (IEMIS 2083 अनुसार)



| छात्रा ९२६ | छात्र १०६६ | जम्मा १९९२ |  |
|------------|------------|------------|--|
|            |            |            |  |

बरेङ गाउँपालिकाको शिक्षक दरबन्दी  
विवरण  
२०८३

| तह                       | स्थायी | राहत | गाउँपालिका अनुदान | संघीय अनुदान | जम्मा |
|--------------------------|--------|------|-------------------|--------------|-------|
| प्राथमिक                 | १०४    | १४   | ०                 | ०            | ११८   |
| निम्न माध्यमिक           | २२     | ३    | ०                 | ०            | २५    |
| माध्यमिक ९-१०            | ११     | १२   | ०                 | ४            | २७    |
| माध्यमिक ११-१२           | ०      | ०    | ०                 | ६            | ६     |
| कार्यालय सहयोगी          | ०      | ०    | ०                 | ३३           | ३३    |
| लेखा कर्मचारी            | ०      | ०    | ०                 | ७            | ७     |
| बालशिक्षक                | ०      | ०    | १                 | २६           | २७    |
| सिकाइ केन्द्र<br>परिचालक | ०      | ०    | ०                 | २            | २     |

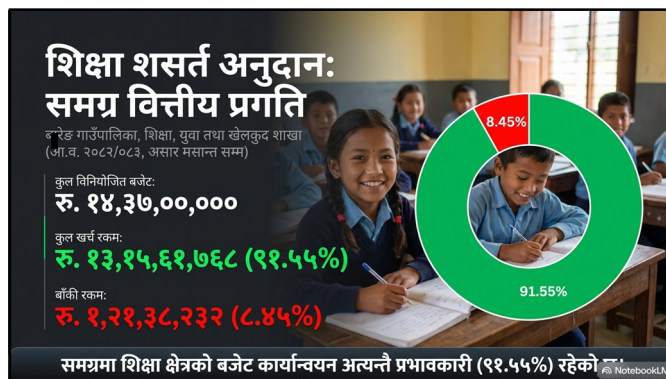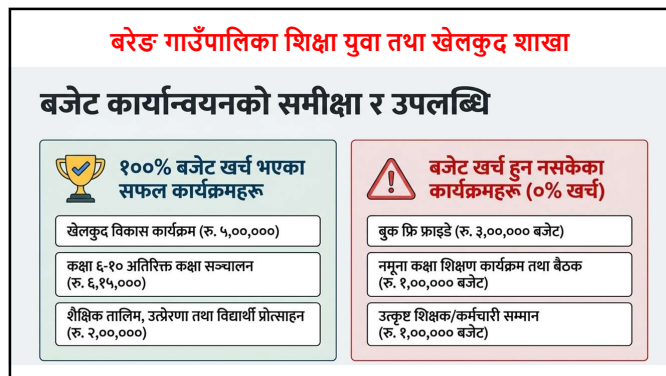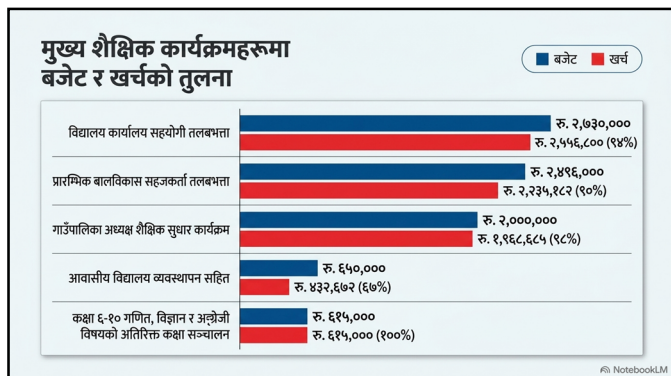



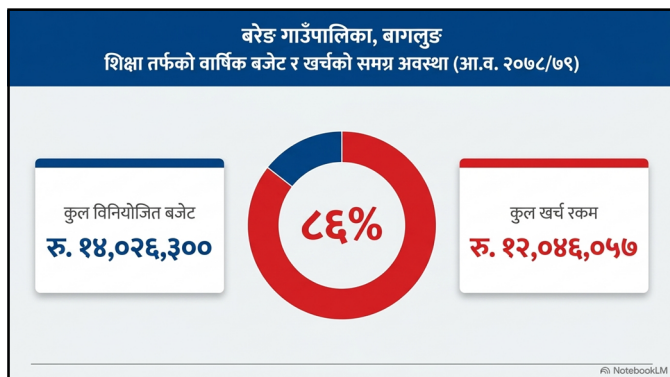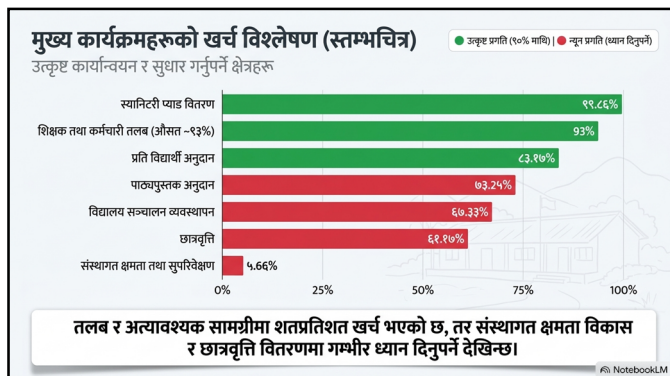







समृद्ध बरेड, सुखी बरेडबासी

घरमा प्रसुती शून्य गाउँपालिकामा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं

## आ.व.२०८२/०८३ मा स्वास्थ्य शाखा र अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कार्यक्रमको प्रगति विवरण

प्रस्तुतकर्ता: पदम बहादुर पुन  
जनस्वास्थ्य अधिकृत

मिति:- २०८३। ०४।२७ गते

स्थान: बरेड गाउँपालिका सभाहल



Email: barengrm@gmail.com



स्वास्थ्य शाखा, बरेड गाउँपालिका बागलुङ

समृद्ध बरेड, सुखी बरेडबासी

घरमा प्रसुती शून्य गाउँपालिकामा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं

|   | सम्पादन भएको प्रमुख कार्यहरू                                    | कार्यान्वयन स्थिति | बजेट    | उपलब्धी                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| १ | स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम                      | सम्पन्न            | २ लाख   | स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा प्रवेश तालिम र स्वयंसेविकाहरूको आधारभूत तालिम |
| २ | पालिका स्तरीय घुम्ती मासिक बैठक तथा सिकाई आदान प्रदान कार्यक्रम | सम्पन्न            | २ लाख   | स्वास्थ्य संस्थाको स्थलगत अवलोकन, समस्या विश्लेषण र जानकारी आदानप्रदान |
| ३ | नसर्ने रोगको स्कृनिङ                                            | सम्पन्न            | १.५ लाख | १८०५ जना मध्ये ३८% मात्र सामान्य                                       |
| ४ | प्रयोगशाला परीक्षण अभियान                                       | सम्पन्न            | २ लाख   | वडा नं. १ मा १० गते, ४ मा २० गते र ५ मा २५ गते                         |
| ५ | बाल पोषण कार्यक्रम                                              | सम्पन्न            | १.५ लाख | वृद्धि अनुगमन पटक १६ बाट १९ पुगेको                                     |
| ६ | विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य परीक्षण                 | सम्पन्न            | २ लाख   | ६५ ओटा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रममा ३००० भन्दा बढीको सहभागिता भएको     |
| ७ | आमा प्रतिक्षाघर व्यवस्थापन                                      | सम्पन्न            | ०       | घरमा प्रसुती शून्य कार्यक्रम कायम रहेको                                |

Email: barengrm@gmail.com



स्वास्थ्य शाखा, बरेड गाउँपालिका बागलुङ

| समृद्ध बरेड, सुखी बरेडवासी |                                                | घरमा प्रसुती शून्य गाउँपालिकामा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं                                                                  |         |                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| क्र स                      | सम्पादन भएको प्रमुख कार्यहरू                   | कार्यान्वयन स्थिति                                                                                                               | बजेट    | सहभागी संख्या                                                     |
| ८                          | मृगौला परीक्षण कार्यक्रम                       | सम्पन्न                                                                                                                          | २ लाख   | ७१५ मध्ये ४२ जनाको क्रेटिनिन १.३                                  |
| ९                          | अति विपन्न मानसिक रोगीलाई उपचार सहायत          | सम्पन्न                                                                                                                          | ५० हजार | आर्थिक सहायता                                                     |
| १०                         | पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन               | सम्पन्न                                                                                                                          | ३ लाख   | शिक्षा शाखा सँगको समन्वयमा वितरण                                  |
| ११                         | स्वयंसेविका स्वास्थ्य विमा र सञ्चार खर्च वितरण | सम्पन्न                                                                                                                          | ४.५ लाख | स्वयंसेविकाको सम्मान र प्रोत्साहन                                 |
| १२                         | मृगौला तथा क्यान्सर रोगीहरूलाई उपचार खर्च      | सम्पन्न                                                                                                                          | १२ लाख  | लक्षित समूहको उपचारमा सहजता                                       |
| १३                         | क्षयरोग सम्बन्धी कार्यक्रम                     | सम्पन्न                                                                                                                          | २ लाख   | कर्मचारीहरूलाई स्थलगत अनुशिक्षण, खोज                              |
| १४                         | प्रजनन रूग्णता स्वास्थ्य सेवा                  | सम्पन्न                                                                                                                          | ८४ हजार | परीक्षण गरिएका ७७ मध्ये २ जनालाई प्रेषण गरिएको                    |
| १५                         | परिवार योजना सेवा                              | सम्पन्न                                                                                                                          | ४० हजार | २२ जनाको सुरक्षित गर्भपतन र २८ जनाको ईम्प्लान्ट सेवा प्रदान गरेको |
| १६                         | आमा सुरक्षा कार्यक्रम                          | सम्पन्न                                                                                                                          | ६.५ लाख | मातृमृत्यु शून्यमा कायम रहेको, पूर्ण संस्थागत सुत्केरी भएको       |
| Email: barengm@gmail.com   |                                                |  <b>स्वास्थ्य शाखा, बरेड गाउँपालिका बागलुङ</b> |         |                                                                   |

| समृद्ध बरेड, सुखी बरेडवासी |                                                     | घरमा प्रसुती शून्य गाउँपालिकामा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं                                                                    |           |                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्र स                      | सम्पादन भएको प्रमुख कार्यहरू                        | कार्यान्वयन स्थिति                                                                                                                 | बजेट      | सहभागी संख्या                                                                                        |
| १७                         | मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम                           | सम्पन्न                                                                                                                            | ११.१२ लाख | नर्सिङ कर्मचारी व्यवस्थापन, उत्तरप्रसुती घरभेट, भिडियो एक्स रे (९३), MNH Update                      |
| १८                         | पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप अभियान        | सम्पन्न                                                                                                                            | ०         | ७३ जना किशोरीहरूलाई खोप सेवा प्रदान                                                                  |
| १९                         | नियमित खोप सुदृढिकरण तथा पूर्ण खोप कार्यक्रम        | सम्पन्न                                                                                                                            | ४.५२ लाख  | स्वास्थ्यकर्मीहरूद्वारा घरघुरी सर्वेक्षण गरी सबै वडा र पालिका पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा               |
| २०                         | न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम सुदृढिकरण कार्यक्रम  | सम्पन्न                                                                                                                            | १.१७ लाख  | स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन तथा सेवा प्रदानमा गुणस्तर वृद्धि भएको, MSS प्रासाङ्कमा सुधार             |
| २१                         | स्वयंसेविकाहरूलाई पोशाक प्रोत्साहन तथा यातायात खर्च | सम्पन्न                                                                                                                            | १४ लाख    | स्वयंसेविकाको सम्मान र प्रोत्साहन                                                                    |
| २२                         | निःशुल्क वितरणको लागि औषधी खरिद र वितरण             | सम्पन्न                                                                                                                            | २१ लाख    | ९८ प्रकारका औषधीहरूको सुनिश्चित गरिएको, नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक प्रत्याभुत |
| Email: barengm@gmail.com   |                                                     |  <b>स्वास्थ्य शाखा, बरेड गाउँपालिका बागलुङ</b> |           |                                                                                                      |

समृद्ध बरेड, सुखी बरेडबासी

घरमा प्रसुती शून्य गाउँपालिकामा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं

- थप कार्यक्रमहरु:
- स्वास्थ्य संस्थाहरुद्वारा निःशुल्क वितरणको लागि औषधी तथा आयुर्वेदिक औषधी खरिद।
- ५ वर्ष मुनीका बालबालिकाहरुलाई जुकाको औषधी(१००९) र भिटामिन ए(११२६) वितरण।
- विद्यालयहरुमा किशोरीहरुलाई आइरन चक्री वितरण।
- स्वास्थ्य संस्थाहरुको लागि मेडिकल तथा विद्युतिय उपकरण खरिद।
- सबै महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई नसर्ने रोग सम्बन्धी अभिमुखीकरण
- स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न दिवसहरुमा विद्यालय तथा समुदायमा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम
- किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सम्बन्धी अभिमुखीकरण
- स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्थलगत अनुशिक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यक्रम
- स्वास्थ्यचौकीहरुको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम कार्यान्वयन
- महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको ५०% छुट सहित स्वास्थ्य बिमा
- लक्ष्य नतोकिएका तथा तोकिएका अन्य आवश्यक कार्यक्रम
- मृगौला तथा क्यान्सर रोगीहरुलाई उपचार खर्च वितरण र उपचार सहूलियत सिफारिस
- आत्महत्या रोकथाम तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन सम्बन्धी ३५० जनालाई अभिमुखीकरण

Email: barengm@gmail.com



स्वास्थ्य शाखा, बरेड गाउँपालिका बागलुङ

समृद्ध बरेड, सुखी बरेडबासी

घरमा प्रसुती शून्य गाउँपालिकामा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं

## आ व २०८२/०८३ को सेवा प्रवाह सम्बन्धी विवरण

| क्र स | सेवाको विवरण                                   | जम्मा | कैफियत               |
|-------|------------------------------------------------|-------|----------------------|
| १     | पूर्णखोप पाएका बालबालिका                       | १२१   |                      |
| २     | पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप(कक्षा ६) | ७३    | छात्रा               |
| ३     | बालबालिकाहरुको वृद्धि अनुगमन                   | १३२   | नयाँ दर्ता           |
| ४     | वृद्धि अनुगमन गर्ने औषत पटक                    | १७.६३ | कुल २४ हुनुपर्ने     |
| ५     | २६ चक्की आइरन प्राप्त गरेका किशोरीहरु          | ४९३   |                      |
| ६     | जुकाको औषधी प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरु        | २३२८  |                      |
| ७     | मलेरियाको रक्तनमुना परीक्षण                    | १०४   | संक्रमण पुष्टी नभएको |

Email: barengm@gmail.com



स्वास्थ्य शाखा, बरेड गाउँपालिका बागलुङ



| समृद्ध बरेड, सुखी बरेडबासी |                                       | घरमा प्रसुती शून्य गाउँपालिकामा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं |                       |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ८                          | क्षयरोगको खकार नमूना परीक्षण          | ८४                                                              | संक्रमण पुष्टी नभएको  |
| ९                          | प्रजनन रुग्णता सेवा                   | ७७                                                              | शंकास्पद १ जना        |
| १०                         | गर्भ जाँच                             | १११                                                             | १८ जना २० वर्ष मुनीका |
| ११                         | सुत्केरी सेवा                         | ५६                                                              |                       |
| १२                         | नसर्ने रोगको स्कृनिङ                  | १८०५                                                            | ३८% मात्र सामान्य     |
| १३                         | मृगौला परीक्षण                        | ७१५                                                             | ९७ जनाको १.३          |
| १४                         | जम्मा परिवार नियजनको साधन प्रयोगकर्ता | ३३१                                                             |                       |
| १५                         | सुरक्षित गर्भपतन                      | २२                                                              |                       |

Email: barengrm@gmail.com



स्वास्थ्य शाखा, बरेड गाउँपालिका बागलुङ

| समृद्ध बरेड, सुखी बरेडबासी            |       | घरमा प्रसुती शून्य गाउँपालिकामा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं |  |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|
| सेवाको विवरण                          | जम्मा | कैफियत                                                          |  |
| महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम | २२३७  |                                                                 |  |
| विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा             | ९४    | २८०४ जना सहभागी                                                 |  |
| समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा               | १३९   | २७६४ जना सहभागी                                                 |  |
| गाउँघर क्लिनिक                        | ९३८   |                                                                 |  |
| उपचारात्मक सेवा                       | १२२३५ | ४४२३ दोहोरिएको                                                  |  |
| खानेपानी गुणस्तर परीक्षण              | ८     |                                                                 |  |
| प्रयोगशाला कार्यक्रम                  | २२२०  |                                                                 |  |
| स्वास्थ्य विमा                        | ११२०  | घरपरिवार                                                        |  |

Email: barengrm@gmail.com



स्वास्थ्य शाखा, बरेड गाउँपालिका बागलुङ

## कृषि सेवा शाखा

बरेङ गाउँपालिका  
हुम्लेशिर -२ बागलुङ

तयारकर्ता- सोमराज रावत  
कृषि शाखा प्रमुख

## कुल बजेट

### पालिका तर्फ

• ६०५००००

### सशर्त तर्फ

• ४६५००००

## खर्च प्रतिशत

पालिका  
तर्फ

खर्च प्रतिशत


७३.८१

सशर्त  
तर्फ


खर्च प्रतिशत

८४.७७


## किसान सूचिकरण कार्यक्रम

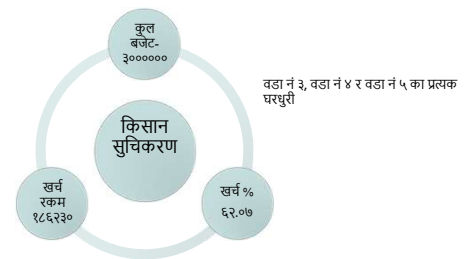


### कृषि, पशुपक्षि, तथा मत्स्य तथाङ्क अभावधिक कार्यक्रम

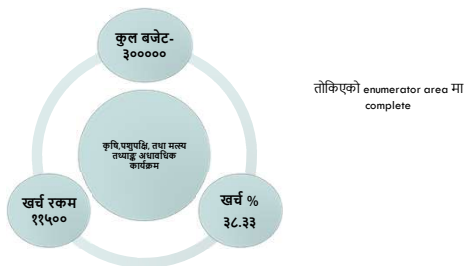


### तरकारी पकेट विकास कार्यक्रम

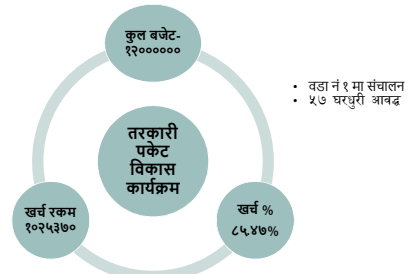

### च्याउ पकेट विकास कार्यक्रम

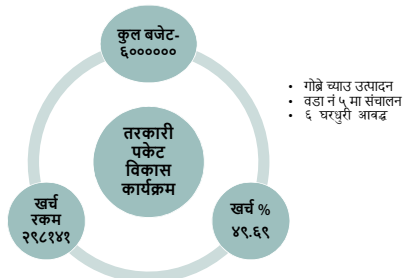

### कृषि हाट बजार स्तरन्नोति

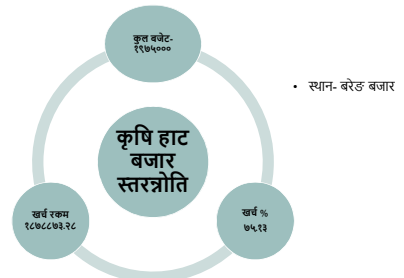



## पालिका तर्फको वार्षिक प्रगति विवरण

कुल बजेट- ६०५००००

जम्मा कार्यक्रम- १८

सम्पन्न कार्यक्रम- १४

कुल खर्च रकम- ४४६५९२२.७९

कुल खर्च प्रतिशत- ७३.८१

## मौरीपालक कृषकलाई तालिम तथा आवश्यक सामग्री

जम्मा बजेट- २५००००

कुल खर्च-२५००००  
खर्च %-१००%

पाँच वटै वडाका  
व्यवसायिक  
कृषकहरु समावेश  
• १५ जना कृषकहरुलाई  
मौरी घर तथा सामग्री  
वितरण  
• ५ दिने तालिम सम्पन्न

## निर्माण भएका बासको टनेलमा सिलपाउलिन प्लाष्टिक १२० GSM निशुल्क वितरण

जम्मा बजेट- ५०००००

कुल खर्च- ३२०४४७  
खर्च %-६४.०९%

चार वटै वडाका  
व्यवसायिक  
कृषकहरु समावेश  
• १५ जना  
कृषकहरुलाई  
वितरण


## जैविक विषादि तथा भिटामिन खरिद निशुल्क

जम्मा  
बजेट- ५०००००


कुल खर्च- ४१६५००  
खर्च %- ८३.३०%

पाचै वटै वडाका  
व्यवसायिक  
कृषकहरुलाई वितरण  
• ८९८ जना  
कृषकहरुलाई वितरण


स्थानिय डल्ले खुर्सानी बेसार बगैचा व्यवस्थापन र  
अन्य उत्पादन प्रत्साधन तथा बजारीकरण  
परीयोजना




बर्षे तथा हिउदे फलफूलका विरुवावितरण  
५०% अनुदानमा



व्यसायीक फार्ममा हाते स्प्रेयर तथा  
न्यापस्याक र सिकेचर निशुल्क वितरण



एकीकृत बालि संरक्षण कार्यक्रम



### कुटानि पिसानी ५०% अनुदान

जम्मा  
बजेट-  
५०००००

कुल खर्च-  
४५३५००  
खर्च %-  
९०.७०%

वडा नं १-८  
वडा नं २- ६  
वडा नं ३- ६  
वडा नं ४- ४  
वडा नं ५-३

### मिनिटिलर ५०% अनुदान

जम्मा  
बजेट-  
५०००००

कुल खर्च-  
४९६२००  
खर्च %-  
९९.२४%

वडा नं १-९  
वडा नं २-६  
वडा नं ३- ६  
वडा नं ४- ४  
वडा नं ५-३

### करेशाबारीका लागि निशुल्क विउ वितरण

जम्मा  
बजेट-  
४०००००

कुल खर्च-  
३३४३४०  
खर्च %-  
८३.५९%

पालिका भित्रका  
सम्पुर्ण घरधुरीमा  
वितरण

### कृषि मेला प्रदर्शन

जम्मा  
बजेट-  
१०००००

कुल खर्च-  
३००००  
खर्च %-  
३०%

कृषकले उत्पादन  
गरएका कृषि  
सामग्रीहरुको प्रदर्शन  
गरि उत्कृष्ट कृषक  
छनोट



## फलफूलको बगैचा व्यवस्थापन

जम्मा  
बजेट-  
२५००००

कुल खर्च-  
२४००००  
खर्च %-  
९६.०%

बडा नं १ मा  
संचालन





पशु सेवा शाखा आ.व २०८२/०८३ को वार्षिक  
प्रतिवेदन मा हार्दिक स्वागत छ।





प्रस्तोता :  
नारायण पौडेल  
पशु शाखा प्रमुख

बरेङ गाउँपालिका पशु सेवा शाखाको  
आ.व २०८२/०८३को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निम्न  
रहेको छ।

- पशु सेवा शाखामा कर्मचारि संख्या: २
- कुल कार्यक्रम संख्या: २३
- सम्पन्न कार्यक्रम: ११
- सशर्त तर्फ जम्मा कार्यक्रम: ३
- सम्पन्न कार्यक्रम: २

कुल बजेट

|         |   |              |
|---------|---|--------------|
| ५२००००० | { | •पालिका तर्फ |
| २०५०००० | { | •सशर्त तर्फ  |

कुल खर्च प्रतिशत

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| ६२.४२% | { | •पालिका तर्फ |
| ८८.९७% | { | •सशर्त तर्फ  |

### आ.ब २०८२/८३ मा परेका आवेदनहरूको विवरण

- माछा पोखरि निर्माण ५० प्रतिशत अनुदान:५
- व्यावसायमुलक बाख्रा फर्मलाई डिपिड ट्याक निर्माण५० प्रतिशत अनुदान:६वटा
- विपन्न वर्गका लागि बंगुरको भुनि तथा विर वितरण कार्यक्रम५० प्रतिशत अनुदान: १०७ जना
- महि मदानि वितरण५० प्रतिशत अनुदानमा: १५१वटा
- बाख्रामा नख सुधार ५० प्रतिशत अनुदान वितरण कार्यक्रम-२० वटा

- विपन्न वर्गका लागिबंगुरको विर तथा भुनि वितरण५० प्रतिशत अनुदान:१०० वटा
- माछा पोखरि निर्माण ५० प्रतिशत अनुदान:३वटा निर्माण
- महि मदानि बितरण५० प्रतिशत अनुदान:१२५वटा
- माछाका भुरा वितरण अनुदानमा २० कृषकहरूलाई तिस हजार कमन कार्प र ग्रास कार्पका भुरा वितरण
- डिपिड ट्याक निर्माण ५० प्रतिशत अनुदानमा २वटा निर्माण

### बरेङ गाँउपालिका मा रहेका पशुहरूको तथ्याङ्क

- गाई: १६०
- भैसि: ३८११
- गोरु: ३७३
- बंगुर: ३८८
- राँगा: ५६
- बाख्रा: ८६०५
- भेडा: ६९
- पशुमा पुर्ण खोप कार्यक्रममा भेटेरिनरि अस्पतालबाट लिएको तथ्यांक अनुसार।

| क्र.स | वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमहरु                          | कार्यान्वयनको अवस्था |                                                           |  | कै |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--|----|
|       |                                                       |                      | संख्या                                                    |  |    |
| 1     | रेबिज खोप कार्यक्रम                                   | सम्पन्न              | ९०घरपालुवा कुकुर तथा विरालो ३३ सामुदायिक कुकुरलाई लाई     |  |    |
| 2     | हिउदे घाँसको बिउ वितरण                                | सम्पन्न              | व्यावसायिक फर्महरूलाई वितरण                               |  |    |
| 3     | पशु स्वास्थ्य उपचारको लागि ओपेथी खरिद                 | सम्पन्न              | नियमित रुपमा वितरण                                        |  |    |
| 4     | बाख्रामा नख सुधार ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण कार्यक्रम | सम्पन्न              | छनोट भएका १९ जना व्यावसायिक कृषकहरूलाई ५०% अनुदानमा वितरण |  |    |

|   |                                        |         |                                                                                                |                   |  |
|---|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| 7 | गोरराज बस्ती ७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरण | सम्पन्न | छनोट भएका २ समुहलाई वितरण                                                                      |                   |  |
| 8 | महिमदानी वितरण ५० प्रतिशत अनुदानमा     | सम्पन्न | छनोट भएका १२५ कुषकहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण                                             | छनोटको चरणमा      |  |
| 9 | माछाका भूरा वितरण अनुदानमा             | सम्पन्न | २० जना माछा पोखरी भएका कुषकहरूलाई कम्तीमा १ ग्राम कार्य जातका ३०००० माछाका भूरा अनुदानमा वितरण | माग संकलन भैरहेको |  |



## वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम




मिति: २०८३ साउन २७ गते

प्रस्तुतकर्ता: केशव राज क्षेत्री


रोजगार संयोजक

**रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र**

**बरेङ गाउँपालिकाको कार्यालय**

**हुनिदशिर बागलुङ**

ChurchClipart.net



**रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र**

**बरेङ गाउँपालिकाको कार्यालय**

**हुनिदशिर बागलुङ**

२९. देशमा रोजगारी भिन्न, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्धनलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CHETV), धन, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रशिक्षण तथा उद्योग, कृषि तथा आर्जुन मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रशिक्षण तालिम तथा उद्यमशीलता केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने। यो केन्द्रले रोजगारविहीनहरूको दर्ता र सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमका अतिरिक्त स्थानीय सीप तथा सोको माग नसम्पन्न, तालिम सम्पन्न, उद्यमशीलता सहजीकरण तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनरासीकरण सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गर्ने। स्थानीय तहलाई उक्त केन्द्रको प्रभावकारी परिचालन गर्न न्युनतम बजेट विनियोजन एवं वार्षिक सीप विकास योजना समीक्षा गरी कार्यक्रमपारदर्शक जवाफदेहिता

| क्र.स | सम्पन्न भएका वार्षिक आयोजनाहरू                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| १     | खानेपानी मुहान मर्मत, सिँचाई कुलो, पदमार्ग, प्रशिक्षालय र भवन प्लाष्टर |
| २     | मुलाघाट सिँचाई कुलो, प्रशिक्षालय, कल्भर्ट र पदमार्ग निर्माण            |
| ३     | धनमुढा, बिदीखर्क पदमार्ग र प्रशिक्षालय निर्माण                         |
| ४     | ढाव पदमार्ग र सल्लेरी पक्की नाली निर्माण                               |
| ५     | सुखौरा पक्की नाली निर्माण र बाझो जग्गामा कृषिबाली उत्पादन कार्यक्रम    |
| ६     | खानेपानी मुहान मर्मत, सिँचाई कुलो, पदमार्ग, प्रशिक्षालय र भवन प्लाष्टर |
| ७     | सिँचाई कुलो खानेपानी मर्मत तथा प्रशिक्षालय निर्माण                     |
| ८     | झोलुङ्गे पुलथेखि खाल्ले कल्भर्टसम्म मोटरबाटो सरोत्रति                  |
| ९     | सिँचाई कुलो खानेपानी तथा पदमार्ग निर्माण                               |
| १०    | पदमार्ग, खानेपानी ट्याङ्की तथा पहिरो व्यवस्थापन                        |
| ११    | सल्यान सल्लेरी खण्ड सडक सरोत्रति                                       |
| १२    | सुखौरास्थित पक्की नाली निर्माण                                         |
| १३    | राष्ट्रिय रोजगार साझेदारी उपभोक्ता समिति मार्फत पक्की नाली निर्माण     |

| क्र.स                                                                   | योजनाको नाम                                                            | वडा | योजनाको संरचनाको क्षेत्र   | कम्प्युटर | विनियोजन रकम | खर्च रकम  | वडाको नाम   | बजेटको खेप  | प्रगति | निर्माण सामग्री साठोथरी | औसत दिन |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------------------|---------|
| १                                                                       | खानेपानी मुहान मर्मत, सिँचाई कुलो, पदमार्ग, प्रशिक्षालय र भवन प्लाष्टर | १   | सामुदायिक पूर्वाधार        | २०        | ७२००००       | ७२००००    | मुलुङ्गखोटे | नेपाल सरकार | १००    | ७०००००                  | ५०      |
| २                                                                       | मुलाघाट सिँचाई कुलो, प्रशिक्षालय, कल्भर्ट र पदमार्ग निर्माण            | २   | सामुदायिक पूर्वाधार/सिँचाई | २०        | ८६००००       | ८६००००    | हुनिदशिर    | नेपाल सरकार | १००    | ९५००००                  | ५०      |
| ३                                                                       | धनमुढा, बिदीखर्क पदमार्ग र प्रशिक्षालय निर्माण, मोटरबाटो ढावन          | ३   | सामुदायिक पूर्वाधार        | २०        | ६७९६८०       | ६७९६८०    | काटाकाथोरे  | नेपाल सरकार | १००    | ८८०००००                 | ५०      |
| ४                                                                       | ढाव पदमार्ग र सल्लेरी पक्की नाली निर्माण                               | ४   | सामुदायिक पूर्वाधार        | १०        | ५०४०००       | ५०४०००    | सम्पन्न     | नेपाल सरकार | १००    | ८२००००                  | ५०      |
| ५                                                                       | सुखौरा पक्की नाली निर्माण र बाझो जग्गामा कृषिबाली उत्पादन कार्यक्रम    | ५   | सामुदायिक पूर्वाधार-कृषि   | १५        | ५०४०००       | ५०४०००    | सुखौरा      | नेपाल सरकार | १००    | ८०००००                  | ५०      |
|                                                                         |                                                                        |     |                            | ९०        | ३२७९६८०      | ३२७९६८०   |             |             |        |                         |         |
| गाउँपालिकाको मातृ लक्ष्यमा केन्द्रमाथि सम्पन्न भएका अन्य आयोजनाको विवरण |                                                                        |     |                            |           |              |           |             |             |        |                         |         |
| क्र.स                                                                   | योजनाको नाम                                                            | वडा | योजनाको संरचनाको क्षेत्र   | कम्प्युटर | विनियोजन रकम | खर्च रकम  | वडाको नाम   | बजेटको खेप  | प्रगति | निर्माण सामग्री साठोथरी | औसत दिन |
| १                                                                       | सिँचाई कुलो खानेपानी मर्मत तथा प्रशिक्षालय निर्माण                     | ३   | सिँचाई तथा खानेपानी        | ५         | ७०००००       | २७२९५०    | सुखौरा      | सम्पन्न     | १००    | ७५                      |         |
| २                                                                       | झोलुङ्गे पुलथेखि खाल्ले कल्भर्टसम्म मोटरबाटो सरोत्रति                  | ३   | सडक खानेपानी               | १३        | ३०००००       | ८७८४०     | सुखौरा      | सम्पन्न     | १००    | ९                       |         |
| ३                                                                       | सिँचाई कुलो खानेपानी तथा पदमार्ग निर्माण                               | १   | सिँचाई तथा खानेपानी        | ५         | ५०००००       | १२०२४०    | सुखौरा      | सम्पन्न     | १००    | ३३                      |         |
| ४                                                                       | पदमार्ग, खानेपानी ट्याङ्की तथा पहिरो व्यवस्थापन                        | ४   | पदमार्ग र खानेपानी         | ४         | ६५००००       | १८८८००    | सुखौरा      | सम्पन्न     | १००    | ७९                      |         |
| ५                                                                       | सल्यान सल्लेरी खण्ड सडक सरोत्रति                                       | ४   | सडक खानेपानी               | ४         | ६८००००       | ३५७८४०    | सुखौरा      | सम्पन्न     | १००    | ४९                      |         |
| ६                                                                       | सुखौरास्थित पक्की नाली निर्माण                                         | ५   | सडक खानेपानी               | ५         | ७०००००       | २२३२००    | सुखौरा      | सम्पन्न     | ९७     | ५२                      |         |
| ७                                                                       | राष्ट्रिय रोजगार साझेदारी उपभोक्ता समिति मोटरबाटो तथा नाली सरोत्रति    | ५   | सडक खानेपानी               | ५         | ७०००००       | २७८४४०    | सुखौरा      | सम्पन्न     | १००    | ६५                      |         |
| ८                                                                       |                                                                        | ९   | सडक खानेपानी               | ९         | ८८७५००       | ८८७५००    |             |             | १००    | २९                      |         |
|                                                                         |                                                                        | ५५  |                            | ५५        | ४७९७२००      | १५,९५,९५० | सुखौरा      | सम्पन्न     | ९५     | ३७५                     |         |

### सारांशमा बजेट र काम

- जम्मा सूचीकृत बेरोजगार संख्या: १०५७
- रोजगार पाएको संख्या: १३५ जना (औसत ५० दिन)
- कुल संशर्त नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम: ३२ लाख ७२ हजार
- वडागत साझेदारी: ९४ लाख ८७ हजार २ सय
- जम्मा विनियोजन: १ करोड २७ लाख ५९ हजार २ सय
- जम्मा खर्च: १ करोड २४ लाख ५९ हजार ३७
- जम्मा बाँकी: ३ लाख ८ सय ४३
- श्रमिकले पाएको दैनिक ज्याला: ७ सय २०
- ज्यालामा मात्र खर्च: ४९ लाख १७ हजार ६ सय
- वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको श्रम स्वीकृति सहजीकरण: ७१ जना
- वैदेशिक रोजगार बोर्ड सम्बन्धी ५ जना (३६ लाख ३६ हजार आर्थिक सहायता)
- वैदेशिक रोजगारमा अलपत्र भएकाको उद्धार: १ जना (कुवेत), ३ जनाको प्रक्रियामा
- छात्रवृत्ति ४ जना (वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएकाको सन्ततिको लागि)

### सम्पन्न भएका अन्य कार्यक्रमहरू

| क्र.स | कार्यक्रमको नाम                                                | कार्यक्रम भएको                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| १.    | रोजगार संवाद मञ्च                                              | सरोकारवाला र स्थानीय तह                               |
| २     | वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकासँग उद्यमशीलता सम्बन्धी अन्तर्क्रिया | जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अन्य सरोकारवाला               |
| ३     | श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान                                 | सूचीकृत बेरोजगार व्यक्ति र समुदाय                     |
| ४     | अन्य अभिमुखीकरण कार्यक्रम                                      | बेरोजगार व्यक्ति र रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र |

ChurchClipart.net

### निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरू

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| खानेपानी ट्याङ्की: १ (५ घ.मि)       | खानेपानी मुहान मर्मत: ३ वटा         |
| प्रतिक्षालय: ६ वटा                  | मोटरबाटो कजवे: १ (६ घ.मि.)          |
| भवन प्लास्टर: २ वटा (२९० स्वा.मि)   | खानेपानी पाइपलाइन विस्तार: ७०० मिटर |
| पक्की सिँचाई कुलो: ४४९ मिटर         | खानेपानी इन्टेक: २ वटा              |
| पक्की नाली: १४२२ मिटर               | पक्की पर्खाल: १३.५ घ.मि             |
| मोटरबाटो ढलान: लम्बाइ ३४४, घ.मि.२३० |                                     |
| मोटरबाटो ग्रावेल: १०० मिटर          |                                     |
| पक्की पदमार्ग: ९९८ मिटर             |                                     |











### सारांशमा सूचना प्रविधि तर्फ

- गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइट, ईमेल तथा फेसबुक पेज नियमित रूपमा सञ्चालन तथा अद्यावधिक
- गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सूचना, पत्राचार, निर्णय तथा सार्वजनिक महत्वका सामग्रीहरू वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित प्रकाशन
- कार्यालयमा प्राप्त हुने पत्राचार तथा सूचनाहरूको अभिलेख व्यवस्थापन र व्यवस्थित फाइलिङ
- सूचना अधिकारीसमक्ष प्राप्त भएका चलानी तथा सूचनासम्बन्धी पत्रहरूको विषयगत रूपमा अभिलेखीकरण गरी आवश्यक पर्दा सहज रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको
- गाउँपालिकाको त्रैमासिक स्वतः प्रकाशन सम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा तयार गरी वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको
- LGPAS सम्बन्धी आवश्यक विवरण, प्रमाण तथा कागजातहरूको व्यवस्थापन गरी प्रणालीमा आवश्यक अद्यावधिक तथा सहजीकरण गरिएको

- गाउँपालिकाको इ-हाजिरी प्रणालीको नियमित अद्यावधिक तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण
- कार्यालयको CCTV प्रणालीको नियमित अनुगमन, सञ्चालन तथा आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन
- गाउँपालिकाका विभिन्न शाखा तथा विषयगत क्षेत्रबाट प्राप्त प्रगति विवरण तथा तथ्याङ्क संकलन गरी आवश्यक प्रतिवेदन तयार
- गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र गाउँसभा सदस्यहरूलाई आवश्यक पत्राचार, सूचना तथा वेटकसम्बन्धी जानकारी नियमित रूपमा प्रवाह गरिएको।
- सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित दैनिक कार्यालयीय प्राविधिक समस्या समाधान तथा आवश्यक प्राविधिक सहजीकरण
- गरिब परिवार पहिचान सम्बन्धी २२१५ घरघुरीको तथ्याङ्क सङ्कलन
- जिन्सी निरीक्षणको कार्य
- गाउँपालिकाको सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीअनुसार नियमित कार्यसम्पादन



**गरिब परिवार पहिचान**

PHMS

Province: Gandaki District: Baglung Local Level: Baring Gaunpalika Ward: Select ward

| Ward | Total HH Surveyed | Total HH Ready For Analysis | Actions |
|------|-------------------|-----------------------------|---------|
| 1    | 611               | 611                         |         |
| 2    | 542               | 542                         |         |
| 3    | 615               | 615                         |         |
| 4    | 262               | 262                         |         |
| 5    | 185               | 185                         |         |

**स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली**

Local Governance Performance Assessment System (LGPAS)

Search: ... Select: ... Select: ...

| क्र.सं. | अवधि वर्ष | समावेश तह      | विस्तर | संस्थापन प्रविधि | प्र.स.स. सविज्ञा | प्रि.स.स. सविज्ञा | मुल्यांकन अंक | QA सविज्ञा अंक | भाग                              |
|---------|-----------|----------------|--------|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------------------|
| 1       | 2083/84   | कोष गाउँपालिका | वाग्लु | 5/313            | 0/313            | 0/313             | 17 / 100.0    | NA             | प्रारम्भिक नतिजा तयार हुँदै      |
| 2       | 2081/82   | कोष गाउँपालिका | वाग्लु | 313/313          | 313/313          | 313/313           | 71.1 / 100.0  | NA             | प्रारम्भिक गुणमूलक पेश गर्न हुने |
| 3       | 2082/83   | कोष गाउँपालिका | वाग्लु | 149/313          | 0/313            | 0/313             | 36.0 / 100.0  | NA             | प्रारम्भिक नतिजा तयार हुँदै      |

## महिला, बालबालिका तथा समाज ईकाई शाखा आ.वं. २०८२/८३ को वार्षिक समिक्षा

बरेङ गाउँपालिका  
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय  
हुम्लिशिर, बागलुङ ।

तयार गर्ने  
सुम्मित घर्ती मगर पुन  
सहायक महिला विकास निरीक्षक

महिला, बालबालिका तथा समाज ईकाई शाखा द्वारा आ.वं. २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा तपसिल बमोजिमका क्रियाकलापहरु सम्पन्न भएका छन् ।

१. तैजिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परीक्षण (GESI AUDIT) कार्यक्रम सम्पन्न ७१% भएको
२. बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका/ वडा स्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । २ दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बालमैत्री स्थानीय शासन समिति, कार्यपालिका सदस्य र गाबाप्रमुख गरी ३७ जनाको उपस्थितिमा ।
३. लागू पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम १२० जनाको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ ।
४. तैजिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान (प्रत्येक वडाकार्यालयमा गई २०२ जनाको उपस्थितिमा)
५. उमेर चौरासी सम्मान कार्यक्रम (१२५ जना लाभग्राही)
६. अपाङ्गता ग र घ वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम । ४९ जना लाभग्राही
७. एक घर एक महिला रोजगार कार्यक्रम (७ जना लाभग्राही)
८. उज्यालो बालबचत कार्यक्रम (४६ जना लाभग्राही)
९. विपन्न स्वास्थ्य बिमा (३२ जना लाभग्राही)

| क्र.सं. | कार्यक्रम/पाजना                                                                      | बजेट   | भातक खर्च | वास्तव्य खर्च | कार्यगत             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|---------------------|
| १.      | तैजिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परीक्षण(GESI AUDIT)                              | २००००० | १००%      | ९०.६३%        |                     |
| २.      | बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका/वडा स्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम | २५०००० | १००%      | ३८.६१%        |                     |
| ३.      | उमेर चौरासी सम्मान कार्यक्रम                                                         | ३५०००० | १००%      | ९५.०९%        |                     |
| ४.      | स्वास्थ्य शाखाको समन्वयमा विपन्न दिर्घरोगी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम                  | ३००००० | १००%      | ३७.३३%        | धनशर शर्मा बाट फछौट |
| ५.      | एक घर एक महिला रोजगार कार्यक्रम                                                      | १२०००० | १००%      | ९९.५४%        |                     |
| ६.      | उज्यालो बालबचत कार्यक्रम                                                             | १५०००० | १००%      | ३६.९३%        |                     |
| ७.      | अपाङ्गता ग र घ वर्गका लागि भत्ता वितरण                                               | ३००००० | १००%      | ३२.६७%        |                     |
| ८.      | तैजिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान                                                   | १३०००० | १००%      | ५९.४२%        |                     |
| ९.      | लागू पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम                                   | १००००० | १००%      | ४८.४१%        |                     |


### समाधानहरु:

स्थानीय तहमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धि कार्य गर्ने संरचना बृहत हुनुपर्ने,

- भौगोलिक विकटता तथा दुर्गम क्षेत्र लाई प्राथमिकतामा राख्ने,
- प्रचुर मात्रामा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
- ऐन, नीति, नियम को प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने,
- जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय कायम राख्ने ,
- प्राप्त रुपमा स्रोत र साधनको उपलब्ध गराउने,
- महिलाहरुको नेतृत्व क्षमता विकास अभिवृद्धि गर्ने,
- हिंसा, बालविवाह, विभेद न्यूनीकरण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने ।





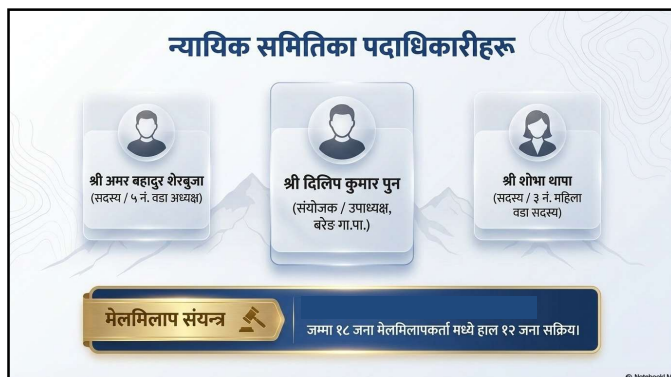

(बरेड गाउँपालिकाको इजलासमा मेलमिलाप गराउँदैका तस्विरहरू)

इजलास कक्ष

आज की विषयवस्तु :-

इसका मतलब है कि ५ किमी. सुरक्षा दूरी का मतलब है कि सुरक्षा दूरी ५ किमी. है।



सुप्री कोर्ट हा भारतीय न्यायपालिका, अख्युक्त कोर्ट. भारतात अख्युक्त न्यायिक न्यायपालिका. सुप्री कोर्ट हा भारतीय न्यायपालिका, अख्युक्त कोर्ट. भारतात अख्युक्त न्यायिक न्यायपालिका.



સાલિય: સલિયે સ્ટ્રી સંચાલિય

स्थलगत अनुगमन पश्चात दुबै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउदै ।



**बागलुङ जिल्ला अन्तर्गत तेस्रो न्यायिक जिल्ला सम्मेलनमा सहभागी हुदाको**






**न्यायिक समितिले गरेका असल अभ्यास र कार्यन्वय गरेका कार्यक्रमहरू:-**

- ५ वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र अघावधिक
- कुनै पनि उजुरी वा मुद्दाको स्थलगत अनुगमन गरी सत्य तथ्य बुझी मेलमिलाप गराउने वा फछ्छौट गर्ने गरेको
- मिति २०८३ जेठ महिनाको २५ देखि २९ गते सम्म विद्यार्थी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको
- बागलुङ जिल्ला अन्तर्गतको तेस्रो न्यायिक सम्मेलनमा सहभागी र घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर ।
- २०८० देखिका उजुरीहरू दर्ता देखी फछ्छौट सम्मका सबै मिसिलहरूको सुरक्षित राखिएको ।







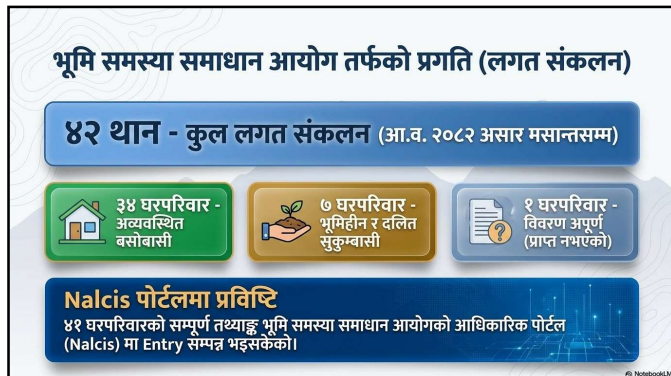



बरेङ गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
हुग्लिेशिर, बागलुङ  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल



२०७३

वार्षिक प्रतिवेदन २०८२/०८३

राजन चालिसे  
एम आइ एस अपरेटर

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण तर्फ

सामाजिक सुरक्षा प्रथम त्रैमासिक विवरण (२०८२-०४-०१ देखि २०८२-०६-३०)

जिल्ला: बागलुङ गा.पा./न.पा.: वरेड आर्थिक वर्ष: २०८२/८३ अबधिको किसिम: त्रैमासिक किस्ता : प्रथम

| गा.पा./न.पा. | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता |          | जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) |         | जेष्ठ नागरिक एकल महिला |         | विधवा (आर्थिक सहायता) |         | क बर्ग |        | ख बर्ग (आर्थिक सहायता) |        | दलित बालबालिका |        | जम्मा  |          |
|--------------|-------------------------|----------|---------------------------|---------|------------------------|---------|-----------------------|---------|--------|--------|------------------------|--------|----------------|--------|--------|----------|
|              | संख्या                  | रकम      | संख्या                    | रकम     | संख्या                 | रकम     | संख्या                | रकम     | संख्या | रकम    | संख्या                 | रकम    | संख्या         | रकम    | संख्या | रकम      |
| वरेड         | ११२५                    | १३४६५६०८ | १९०                       | १४९४९२० | १३१                    | १०२६७६० | २०५                   | १६२३६३० | ३२     | ३८३०४० | ८८                     | ५५९६६४ | २६५            | ४१३८१३ | २०३६   | १८९६७४३५ |
| जम्मा        | ११२५                    | १३४६५६०८ | १९०                       | १४९४९२० | १३१                    | १०२६७६० | २०५                   | १६२३६३० | ३२     | ३८३०४० | ८८                     | ५५९६६४ | २६५            | ४१३८१३ | २०३६   | १८९६७४३५ |

जिल्ला: बागलुङ गा.पा./न.पा.: वरेड आर्थिक वर्ष: २०८२/८३ अबधिको किसिम: त्रैमासिक किस्ता : द्वितीय

| गा.पा./न.पा. | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता |          | जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) |         | जेष्ठ नागरिक एकल महिला |         | विधवा (आर्थिक सहायता) |         | क बर्ग |        | ख बर्ग (आर्थिक सहायता) |        | दलित बालबालिका |        | जम्मा  |          |
|--------------|-------------------------|----------|---------------------------|---------|------------------------|---------|-----------------------|---------|--------|--------|------------------------|--------|----------------|--------|--------|----------|
|              | संख्या                  | रकम      | संख्या                    | रकम     | संख्या                 | रकम     | संख्या                | रकम     | संख्या | रकम    | संख्या                 | रकम    | संख्या         | रकम    | संख्या | रकम      |
| वरेड         | १११३                    | १३३१६९३४ | २००                       | १५६९४०० | १३४                    | १०६४००० | २०९                   | १६५२७७७ | ३२     | ३८३०४० | ८८                     | ५६१७९२ | २७८            | ४१८१९५ | २०५४   | १८९६६१३८ |
| जम्मा        | १११३                    | १३३१६९३४ | २००                       | १५६९४०० | १३४                    | १०६४००० | २०९                   | १६५२७७७ | ३२     | ३८३०४० | ८८                     | ५६१७९२ | २७८            | ४१८१९५ | २०५४   | १८९६६१३८ |

जिल्ला: बागलुङ गा.पा./न.पा.: वरेड आर्थिक वर्ष: २०८२/८३ अबधिको किसिम: त्रैमासिक किस्ता : तृतीय

| गा.पा./न.पा. | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता |          | जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) |         | जेष्ठ नागरिक एकल महिला |         | विधवा (आर्थिक सहायता) |         | क बर्ग |        | ख बर्ग (आर्थिक सहायता) |        | दलित बालबालिका |        | जम्मा  |          |
|--------------|-------------------------|----------|---------------------------|---------|------------------------|---------|-----------------------|---------|--------|--------|------------------------|--------|----------------|--------|--------|----------|
|              | संख्या                  | रकम      | संख्या                    | रकम     | संख्या                 | रकम     | संख्या                | रकम     | संख्या | रकम    | संख्या                 | रकम    | संख्या         | रकम    | संख्या | रकम      |
| वरेड         | ११०५                    | १३१६७६१४ | २०५                       | १६२३६६४ | १३७                    | १०८७९४० | २१४                   | १६९१७६० | ३३     | ३९१०२० | ८८                     | ५५७५३६ | २७८            | ४२४८९२ | २०६०   | १८९४४४२६ |
| जम्मा        | ११०५                    | १३१६७६१४ | २०५                       | १६२३६६४ | १३७                    | १०८७९४० | २१४                   | १६९१७६० | ३३     | ३९१०२० | ८८                     | ५५७५३६ | २७८            | ४२४८९२ | २०६०   | १८९४४४२६ |

जिल्ला: बागलुङ गा.पा./न.पा.: वरेड आर्थिक वर्ष: २०८२/८३ अबधिको किसिम: त्रैमासिक किस्ता : चौथो

| गा.पा./न.पा. | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता |          | जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) |         | जेष्ठ नागरिक एकल महिला |         | विधवा (आर्थिक सहायता) |         | क बर्ग |        | ख बर्ग (आर्थिक सहायता) |        | दलित बालबालिका |        | जम्मा  |          |
|--------------|-------------------------|----------|---------------------------|---------|------------------------|---------|-----------------------|---------|--------|--------|------------------------|--------|----------------|--------|--------|----------|
|              | संख्या                  | रकम      | संख्या                    | रकम     | संख्या                 | रकम     | संख्या                | रकम     | संख्या | रकम    | संख्या                 | रकम    | संख्या         | रकम    | संख्या | रकम      |
| बरेड         | १०९१                    | १३०६३२५८ | २१०                       | १६५९८४० | १३७                    | १०९३२६० | २१८                   | १७२६३४० | ३४     | ४०२९९० | ९१                     | ५७२४३२ | २८१            | ४३११४० | २०६२   | १८९४९२६० |
| जम्मा        | १०९१                    | १३०६३२५८ | २१०                       | १६५९८४० | १३७                    | १०९३२६० | २१८                   | १७२६३४० | ३४     | ४०२९९० | ९१                     | ५७२४३२ | २८१            | ४३११४० | २०६२   | १८९४९२६० |

नयाँ दर्ता सम्बन्धि विवरण (२०८२-०४-०१ देखि २०८३-०३-३१)

| क्र.सं. | सामाजिक सुरक्षा किसिम | दर्ता संख्या | कैफियत |
|---------|-----------------------|--------------|--------|
| १       | जेष्ठ नागरिक ७० माथि  | ७            |        |
| २       | दलित जेष्ठ            | २५           |        |
| ३       | एकल महिला ६० माथि     | ९            |        |
| ४       | विधवा                 | १८           |        |
| ५       | पूर्ण अपाङ्ग          | २            |        |
| ६       | अति अशक्त अपाङ्ग      | ५            |        |
| ७       | दलित बालबालिका        | ५५           |        |
|         | जम्मा                 | १२१          |        |

लगत कट्टा सम्बन्धि विवरण (२०८२-०४-०१ देखि २०८३-०३-३१)

| क्र.सं. | सामाजिक सुरक्षा किसिम | दर्ता संख्या | कैफियत |
|---------|-----------------------|--------------|--------|
| १       | जेष्ठ नागरिक ७० माथि  | ४४           |        |
| २       | दलित जेष्ठ            | २            |        |
| ३       | एकल महिला ६० माथि     | १            |        |
| ४       | विधवा                 | ३            |        |
| ५       | पूर्ण अपाङ्ग          | ०            |        |
| ६       | अति अशक्त अपाङ्ग      | १            |        |
| ७       | दलित बालबालिका        | ६            |        |
|         | जम्मा                 | ९८           |        |



## घटना दर्ता तर्फ

जिल्ला : बागलुङ गा.पा/न.पा. : वरेड दर्ता मिति देखि : २०८२-०४-०१ दर्ता मिति सम्म : २०८३-०३-३१

| वडा नं. | जन्म  |       |              |       | मृत्यु |       |              |       | सम्बन्ध बिच्छेद | विवाह | बसाई सरी आएको |                | बसाई सरी जाने |                | बेवारिसे | जम्मा |
|---------|-------|-------|--------------|-------|--------|-------|--------------|-------|-----------------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|-------|
|         | पुरुष | महिला | तेश्रो लिङ्ग | जम्मा | पुरुष  | महिला | तेश्रो लिङ्ग | जम्मा | जम्मा           | जम्मा | दर्ता संख्या  | सदस्यको संख्या | दर्ता संख्या  | सदस्यको संख्या | जम्मा    |       |
| १       | ३४    | २९    |              | ६३    | १४     | १७    |              | ३१    | ६               | ३३    | १             | १              | २०            | ६५             |          | १५४   |
| २       | ६८    | ५१    |              | ११९   | २९     | १९    |              | ४८    | ५               | ५१    | ५             | १६             | २८            | १११            |          | २५६   |
| ३       | ४६    | ५६    |              | १०२   | २२     | १३    |              | ३५    | ९               | ५२    | २             | ६              | ३६            | १४०            |          | २३६   |
| ४       | १७    | १५    |              | ३२    | ११     | १०    |              | २१    | १               | १८    | १             | २              | १२            | ५३             |          | ८५    |
| ५       | १२    | १८    |              | ३०    | ३      | ३     |              | ६     | ३               | २७    |               |                | ९             | ३१             |          | ७५    |
| जम्मा   | १७७   | १६९   | ०            | ३४६   | ७९     | ६२    | ०            | १४१   | २४              | १८१   | ९             | २५             | १०५           | ४००            | ०        | ८०६   |

## घटना दर्ता समय अन्तर प्रतिवेदन

जिल्ला : बागलुङ गा.पा/न.पा. : वरेड दर्ता मिति देखि : २०८२-०४-०१ दर्ता मिति सम्म : २०८३-०३-३१ वर्ष देखि : ० वर्ष सम्म : १०० दर्ता अन्तर : १००

| दर्ता प्रकार    | दर्ता भएको वर्ष |            |            |       |
|-----------------|-----------------|------------|------------|-------|
|                 | १-३५ दिन        | ३६-३६५ दिन | १-१०० वर्ष | जम्मा |
| जन्म            | ५७              | ४९         | २४०        | ३४६   |
| मृत्यु          | ७७              | १७         | ४७         | १४१   |
| सम्बन्ध बिच्छेद | १४              | ७          | ३          | २४    |
| विवाह           | ४१              | ३५         | १०५        | १८१   |
| बसाई सरी आएको   | ९               | ०          | ०          | ९     |

|               |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| बसाई सरी जाने | १०५ | ०   | ०   | १०५ |
| जम्मा         | ३०३ | १०८ | ३९५ | ८०६ |

व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिलिपि प्रतिवेदन

दर्ता मिति देखि: २०८२-०४-०१ दर्ता मिति सम्म: २०८३-०३-३१

| वडा   | जन्म | मृत्यु | विवाह | बसाई सराइ | सम्बन्ध बिच्छेद |
|-------|------|--------|-------|-----------|-----------------|
| १     | २२९  | १२     | ३१    |           | १               |
| २     | २३७  | ८      | ३९    | १०        |                 |
| ३     | २२०  | १      | १२    | ६         | ३               |
| ४     | ९९   | ३      | १३    | १         |                 |
| ५     | ८०   | २      | ६     |           | ३               |
| जम्मा | ८६५  | २६     | १०१   | १७        | ७               |

## नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र शाखा वार्षिक प्रगति

प्रस्तुतकर्ता  
अग्नि कुमारी चौधरी

## मुख्य कार्यक्रमहरू

- औषधि खरिद
- कार्यालय व्यवस्थापन
- नियमित विरामी परिक्षण
- औषधि वितरण
- विरामीलाई पुर्वकर्म सेवा
- वडा नं १, ४ र ५ मा स्थानियलाई आयुर्वेदिक जडिबुटी को बारे जानकारी प्रदान
- वडा नं ४ को सपौदेमा योग कार्यक्रम
- सतावरी ग्रानुलस वितरण

## जम्मा सेवाग्राहि

१२७४  
• नयाँ  
विरामी  
सङ्ख्या

४४७  
• पुरानो

११८९  
• महिला

५५०  
• पुरुष

३४  
पुर्वकर्म

१०१  
जेष्ठनागरिक

२७  
स्तनपाई

जम्मा विरामी सङ्ख्या-१७२१

## उपलब्धिहरू

- स्थानीय नागरिकलाई नियमित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको।
- नयाँ तथा पुराना बिरामीको नियमित परीक्षण तथा उपचार गरिएको।
- आवश्यकताअनुसार आयुर्वेदिक औषधि वितरण गरिएको।
- पूर्वकर्म सेवा प्रदान गरिएको।
- महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्रदान गरिएको।
- आयुर्वेदिक जडीबुटीसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गरिएको।
- योग कार्यक्रममार्फत स्वस्थ जीवनशैलीसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गरिएको।
- सतावरी ग्रानुलस लगायतका आयुर्वेदिक औषधि वितरण गरिएको।
- स्थानीय नागरिकहरूमा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिप्रति विश्वास तथा आकर्षण बढाउन सहयोग पुगेको।

